

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 - Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	DD/MM/AAAA
		Página:	1 de 20

0. Contexto: DOSW como gestor de proyecto

En este taller, DOSW actúa como el **equipo de gestión de proyecto** contratado por el Comité Organizador del torneo. DOSW no es quien desarrolla la plataforma: es quien analiza el sistema, estructura todo el trabajo y entrega un backlog completo en Jira para que un equipo externo de desarrollo lo ejecute. Su producto final no es código — es un tablero de Jira impecable que cualquier desarrollador pueda tomar y empezar a trabajar sin hacerle una sola pregunta al cliente.

Lo que DOSW entrega al finalizar este taller:

- Diagrama C4 Nivel 1 del sistema TECH CUP (imagen + archivo fuente).
- Una épica TCH-EPIC-01 documentada y cargada en Jira.
- Todos los features identificados con descripción y criterios de aceptación.
- Historias de usuario asociadas a cada feature (Como / quiero / para).
- Todas las tareas técnicas descritas con suficiente detalle para que el desarrollador las ejecute SIN consultar a nadie.
- 7 sprints configurados en Jira con fechas y tareas distribuidas.
- 8 capturas de pantalla de Jira como evidencia.

La clave del rol de gestor: una tarea bien escrita por DOSW no dice "implementar el login". Dice: "Crear el endpoint POST /api/v1/auth/login que recibe correo y contraseña, valida contra la base de datos, genera un JWT con expiración de 8 horas y devuelve 200 con el token o 401 con el mensaje de error correspondiente." El desarrollador no tiene que inferir nada.

1. Diagrama C4 — Nivel 1: Contexto del sistema

El diagrama de contexto muestra el sistema como una caja negra, los actores que interactúan con él y los sistemas externos de los que depende. Es la base para que el equipo de desarrollo entienda el alcance sin leer el enunciado completo.

1.1 Actores identificados en el enunciado

Actor	Tipo	Interacción con TECH CUP FÚTBOL
Estudiante / Jugador	Persona	Registro, perfil deportivo, búsqueda de equipo, consulta de resultados y estadísticas.
Capitán	Persona (rol)	Crea y administra el equipo, gestiona inscripción, alineaciones y jugadores.
Árbitro	Persona	Gestiona el partido en vivo: tiempo, goles, tarjetas y sustituciones.
Organizador	Persona (admin)	Crea torneos, aprueba inscripciones, gestiona árbitros y ve el dashboard.
Graduado / Familiar	Persona	Se registra con correo Gmail y puede participar como jugador o capitán.
Servidor de correo (SMTP)	Sistema externo	Envío de códigos OTP para registro, login y acciones sensibles.
Servicio de mapas	Sistema externo	Muestra ubicación de canchas en el campus.
Almacenamiento de archivos	Sistema externo	Guarda fotos de perfil, escudos de equipo y comprobantes de pago.

1.2 Instrucciones

Herramienta recomendada: draw.io con la plantilla C4 (Extra → Edit Diagram → insertar XML C4).

El diagrama debe tener:

- Rectángulo central 'TECH CUP FÚTBOL' con descripción de una línea.
- Cada actor como figura separada con nombre y descripción breve.
- Flechas etiquetadas con dirección y propósito de la interacción.
- Leyenda clara: persona vs. sistema externo.

Entrega: inserte la imagen abajo y guarde el .drawio en docs/um1/ del repositorio.

[Inserte aquí el Diagrama C4 Nivel 1 — Contexto del sistema]



2. La jerarquía ágil del backlog

Todo el backlog que DOSW construye en Jira sigue cuatro niveles. Antes de abrir Jira, el equipo debe tener claro este mapa para no poner tareas donde van features ni features donde va la épica.

ÉPICA	1 épica = el proyecto completo. Objetivo de negocio que no cabe en un sprint. Tiene fechas, descripción y criterios de éxito. DOSW crea una sola épica: TCH-EPIC-01.
FEATURE	Capacidad completa del sistema. Su descripción incluye las historias de usuario (Como/quiero/para) y los criterios de aceptación (Dado/Cuando/Entonces). En Jira solo existe la épica, los features y las tareas — las HU son texto dentro de la descripción del feature.
TAREA TÉCNICA	Unidad de trabajo estimable: 1 punto = 1 día. DOSW la describe con suficiente detalle para que el desarrollador la ejecute sin hacer preguntas. Título: verbo en infinitivo + objeto técnico.

¿Qué features planea DOSW además de los funcionales?		
Un proyecto real necesita más que código funcional. DOSW debe planear y describir en Jira las siguientes capacidades de infraestructura del proyecto:		
Código	Feature de infraestructura	Por qué existe
FEAT-INF-01	Configuración del repositorio y GitHub Flow	Sin repositorio configurado el equipo no puede trabajar.
FEAT-INF-02	Documentación técnica (README, arquitectura, APIs)	El equipo de desarrollo necesita saber cómo está organizado el sistema.
FEAT-INF-03	Manual de identidad visual TECH CUP	El frontend necesita la paleta, tipografías y logo antes de empezar.
FEAT-INF-04	Configuración de Jira (épica, features, sprints, tablero)	Este mismo taller — el backlog que DOSW entrega es el producto.
FEAT-INF-05	Presentación final y demo del sistema	La entrega del 1 de octubre incluye una presentación al Comité.

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	DD/MM/AAAA
		Página:	5 de 20

3. La épica — TCH-EPIC-01

DOSW crea una sola épica en Jira que representa el proyecto completo. Todos los features y tareas cuelgan de ella. La épica no se cierra al final de un sprint: se cierra el 1 de octubre cuando el sistema esté entregado.

Instrucción: documenten la épica en la siguiente plantilla y luego créenla exactamente igual en Jira (Projects → Backlog → Create Issue → Epic). Capturen la épica creada con todos los campos visibles.

Código	TCH-EPIC-01
Nombre	Plataforma digital TECH CUP FÚTBOL
Fecha de inicio	08/08/2026 — Sprint 1
Fecha de cierre	01/10/2026 — cierre del Sprint 7
Propietario (DOSW)	Nombre del integrante que gestiona la épica en Jira
Problema que resuelve	El torneo semestral se organiza con WhatsApp, formularios y hojas de cálculo. Eso genera retrasos, errores de inscripción, resultados inconsistentes y mal manejo de la logística.
Objetivo	Diseñar e implementar una plataforma web centralizada que gestione el ciclo completo del torneo: inscripciones, equipos, partidos, arbitraje en vivo, estadísticas y comunicaciones.
Alcance incluido	Identidad y autenticación · Perfil deportivo · Equipos · Torneos e inscripciones · Calendario · Competencia y alineaciones · Arbitraje en vivo · Logística · Estadísticas · Comunicaciones · Dashboard del organizador
Alcance excluido	Pagos en línea dentro de la plataforma · Torneos de otros deportes · Aplicación móvil nativa · Integración con sistemas externos de la Escuela
Criterios de éxito (para el Comité)	✓ El torneo puede gestionarse completamente desde la plataforma sin hojas de cálculo. ✓ El árbitro puede gestionar un partido en vivo desde un celular. ✓ Todos los actores completan su flujo principal sin asistencia. ✓ La plataforma cumple WCAG 2.1 AA.

4. Features del backlog

DOSW identifica los features a partir de los servicios del sistema y los requerimientos del Taller 5. Cada feature representa una capacidad completa que el equipo de desarrollo puede implementar y demostrar por separado. La siguiente tabla es el mapa inicial — DOSW puede agregar o dividir features según el análisis del equipo.

4.1 Mapa de features

Código	Nombre del feature	TCH-RF relacionados	Sprint sugerido
FEAT-01	Registro e identidad de usuarios	TCH-RF-01 (Identidad)	Sprint 1
FEAT-02	Perfil deportivo y gestión de jugadores	TCH-RF-02 (Usuarios)	Sprint 2
FEAT-03	Creación y administración de equipos	TCH-RF-03 (Equipos)	Sprint 2
FEAT-04	Inscripción al torneo y verificación de pago	TCH-RF-04	Sprint 3
FEAT-05	Gestión del torneo y calendario de partidos	TCH-RF-05	Sprint 3
FEAT-06	Alineaciones y competencia	TCH-RF-06	Sprint 3-4
FEAT-07	Módulo de arbitraje en vivo	TCH-RF-07	Sprint 4
FEAT-08	Logística (refrigerios y dotación)	TCH-RF-08	Sprint 4
FEAT-09	Estadísticas individuales y por equipo	TCH-RF-09	Sprint 5
FEAT-10	Comunicaciones y chats	TCH-RF-10	Sprint 5
FEAT-11	Llaves eliminatorias y tabla de posiciones	TCH-RF-11	Sprint 5-6
FEAT-12	Dashboard del organizador	TCH-RF-12	Sprint 6
FEAT-INF-01	Configuración del repositorio y ramas	—	Sprint 1
FEAT-INF-02	Documentación técnica	—	Sprint 1 y 7
FEAT-INF-03	Manual de identidad visual	—	Sprint 1
FEAT-INF-04	Configuración de Jira	—	Sprint 1
FEAT-INF-05	Presentación final y demo	—	Sprint 7

4.2 Plantilla de documentación de un feature

Instrucción: documenten TODOS los features. En el campo Descripción incluyan las Historias de Usuario del feature (Como/quiero/para). Los Criterios de Aceptación van en Dado/Cuando/Entonces y deben ser verificables. Las HU NO son issues separados en Jira — son parte de la descripción.

Código del feature	FEAT-XX
--------------------	---------

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 - Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	DD/MM/AAAA
		Página:	7 de 20

Nombre	
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint X (dd/mm – dd/mm/2026)
Descripción / Historias de usuario	¿Qué capacidad habilita este feature? ¿Qué problema del cliente resuelve? <i>Incluir las Historias de Usuario en formato:</i> • Como [rol], quiero [acción], para [beneficio] Agregar mínimo 2 HU por feature funcional.
Criterios de aceptación	Mínimo 2, formato Dado/Cuando/Entonces: ✓ Dado que... cuando... entonces... ✓ Dado que... cuando... entonces... ✗ Dado que... cuando... entonces el sistema rechaza y muestra...
Puntos estimados	Suma de puntos de sus tareas (1 día = 1 punto)

5. Tareas técnicas — descripción para el desarrollador

Las tareas son el nivel más importante del trabajo de DOSW. Una tarea bien escrita permite que un desarrollador la tome y la ejecute SIN hacer preguntas al equipo de gestión. DOSW no implementa nada, pero sí describe con precisión qué hay que hacer.

Escala de puntos (1 punto = 1 día de trabajo de un desarrollador):		
Puntos	Cuándo usar	Ejemplo
1 punto	Tarea simple, bien definida, sin incertidumbre técnica.	Crear la entidad Usuario con sus atributos en PostgreSQL.
2 puntos	Tarea con algo de complejidad o requiere decisión técnica.	Implementar el servicio de envío de OTP con expiración de 10 min.
3 puntos	Tarea compleja: integración de componentes o nueva tecnología.	Configurar Spring Security con JWT para validar tokens en el API Gateway.
	Si necesita más de 3 puntos, DOSW debe dividirla en subtareas más pequeñas.	

6.1 Ejemplo de tareas para FEAT-01 — Registro e identidad

Así describe DOSW las tareas para que el equipo de desarrollo las ejecute sin preguntas:

Código	Título de la tarea	Descripción técnica para el desarrollador	Pts
TASK-01	Crear la entidad Usuario en PostgreSQL	Diseñar la tabla usuarios con los campos: id (UUID), nombre_completo, correo (único), contraseña_hash, tipo_correo (INSTITUCIONAL/GMAIL), rol (JUGADOR/CAPITAN/ARBITRO/ORGANIZADOR), estado (ACTIVO/INACTIVO), fecha_creacion. Crear la entidad JPA y su repositorio Spring Data.	1
TASK-02	Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/register	Recibir: nombre, correo, contraseña. Validar: correo único, contraseña mínimo 8 caracteres (1 mayúscula, 1 número). Si pasa las validaciones, guardar en BD con contraseña hasheada (bcrypt) y disparar el envío del OTP. Devolver 201 con mensaje de confirmación o 400 con los errores de validación.	2
TASK-03	Implementar el servicio de envío de OTP	Generar un código numérico de 6 dígitos. Guardarlo en la tabla otp_tokens con el correo, el código hasheado y un timestamp de expiración (10 minutos). Enviar al correo del usuario con JavaMailSender usando la plantilla HTML de bienvenida. Bloquear reenvío por 60 segundos.	2
TASK-04	Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/verify-otp	Recibir: correo, código. Buscar el OTP más reciente no expirado para ese correo. Si coincide: marcar la cuenta como ACTIVA, invalidar el OTP. Devolver 200. Si no coincide o está expirado: devolver 400. Tras 3 intentos fallidos, bloquear el correo por 5 minutos.	2
TASK-05	Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/login	Recibir: correo, contraseña. Validar contraseña con bcrypt. Si es válida, generar JWT firmado con la clave secreta, con payload: userId, rol, tipo_correo, exp (8 horas). Devolver 200 con el token. Si falla: devolver 401. Registrar el evento en la tabla de auditoría.	2

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 - Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	DD/MM/AAAA
		Página:	9 de 20

TASK-06	Configurar Spring Security y el filtro JWT en el API Gateway	Crear el filtro JwtAuthenticationFilter que intercepta cada request, extrae el Bearer token del header Authorization, lo valida (firma, expiración, formato) y carga el usuario en el SecurityContext. Las rutas /auth/** son públicas. Todo lo demás requiere token válido.	3
TASK-07	Documentar los endpoints en Swagger/OpenAPI 3.0	Agregar las anotaciones @Operation, @ApiResponse y @RequestBody con ejemplos de request/response exitoso y de error para cada endpoint de autenticación. Verificar que el Swagger UI en /swagger-ui.html muestre todos los contratos correctamente.	1

6.2 Ejemplo de tareas de infraestructura

Código	Feature	Tarea	Descripción para el desarrollador	Pts
TASK-I01	FEAT-INF-01	Crear el repositorio en GitHub	Crear el repo con el nombre DOSW-TechCup-2026 en la organización. Inicializar con README, .gitignore para Java/Maven y licencia MIT. Configurar las ramas: main (protegida, requiere PR y 1 aprobación), develop (protegida) y la convención feature/FEAT-XX-nombre.	1
TASK-I02	FEAT-INF-01	Configurar el template de Pull Request	Crear el archivo .github/pull_request_template.md con el checklist: descripción del cambio, issue relacionado, tipo de cambio (feature/fix/docs), pruebas realizadas y criterios de aceptación cumplidos.	1
TASK-I03	FEAT-INF-03	Definir la paleta de colores y tipografías	Basarse en la sección 8 del enunciado (negro carbón #1B2A4A, dorado, morado). Crear el archivo /docs/brand/brand-guide.md con: valores HEX de la paleta, tipografía principal y secundaria, tamaños mínimos del logo y ejemplos de uso correcto e incorrecto.	1
TASK-I04	FEAT-INF-03	Diseñar el logo y las variaciones del escudo	Crear el logo en SVG en 3 versiones: completo (escudo + texto), solo escudo (para favicon/app icon) y versión monocromática. Exportar en PNG a 512x512, 256x256 y 64x64. Guardar en /docs/brand/logo/.	2
TASK-I05	FEAT-INF-02	Crear el diagrama de arquitectura de microservicios	Modelar en draw.io los 9 microservicios (identidad, usuarios, equipos, torneos, competencia, logística, árbitro, estadísticas, comunicaciones) con el API Gateway como punto de entrada. Indicar las conexiones, bases de datos (PostgreSQL/MongoDB) y protocolos (REST/WebSocket). Guardar en /docs/architecture/.	2

6.3 Plantilla de tarea

Instrucción: documenten TODAS las tareas en esta plantilla antes de cargarlas en Jira. La columna 'Descripción' es la más importante: si el desarrollador necesita preguntar algo después de leerla, la descripción está incompleta.

Código	TASK-XX
Feature padre	FEAT-XX — las HU van en la descripción del feature, no como issue separado
Título	Verbo en infinitivo + objeto técnico concreto

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 - Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	DD/MM/AAAA
		Página:	10 de 20

Descripción para el desarrollador	QUÉ hay que hacer, con qué datos, qué valida, qué devuelve, qué registra. Sin ambigüedad.
Puntos (1 día = 1 punto)	1 / 2 / 3
Definición de Terminado	¿Cómo sabe el desarrollador que terminó? (ej.: prueba pasando, endpoint documentado en Swagger, PR aprobado)

6. Planificación de sprints

DOSW planifica 7 sprints de 1 semana cada uno, del 8 de agosto al 1 de octubre de 2026. **La capacidad por sprint es de 20 puntos** (4 personas × 5 días). El Sprint 7 tiene 28 puntos porque dura 2 semanas. DOSW distribuye las tareas respetando la capacidad — si un sprint supera los 20 puntos, las tareas sobrantes pasan al siguiente.

7.1 Tabla resumen

Sprint	Fechas	Foco	Features	Entregable clave	Cap.
Sprint 1	08/08–14/08/26	Base del proyecto + identidad	FEAT-INF-01, FEAT-INF-02, FEAT-INF-03, FEAT-INF-04, FEAT-01	Repositorio configurado, manual de identidad, Jira listo, registro + login con OTP funcional.	20pts
Sprint 2	15/08–21/08/26	Perfil deportivo y equipos	FEAT-02, FEAT-03	Jugador crea su perfil deportivo. Capitán crea equipo y gestiona jugadores.	20pts
Sprint 3	22/08–28/08/26	Torneos, inscripción y alineaciones	FEAT-04, FEAT-05, FEAT-06 (parcial)	Organizador crea torneo. Capitán inscribe equipo con comprobante. Calendario visible.	20pts
Sprint 4	29/08–04/09/26	Competencia y arbitraje en vivo	FEAT-06 (cierre), FEAT-07, FEAT-08	Capitán gestiona alineaciones. Árbitro opera el módulo en vivo. Logística registrada.	20pts
Sprint 5	05/09–11/09/26	Estadísticas, comunicaciones y llaves	FEAT-09, FEAT-10, FEAT-11	Estadísticas automáticas. Chat de equipo. Llaves eliminatorias generadas.	20pts
Sprint 6	12/09–18/09/26	Dashboard y correcciones	FEAT-12, Corrección de bugs S4-S5	Dashboard del organizador. Bugs críticos corregidos. Pruebas de integración.	20pts
Sprint 7	19/09–01/10/26	Documentación final y demo	FEAT-INF-02 (cierre), FEAT-INF-05	README completo. Arquitectura documentada. Presentación lista. Demo en staging. Entrega el 01/10.	28pts

7.2 Ficha de cada sprint

Instrucción: complete el Criterio de Cierre de cada sprint (¿cómo sabe el equipo que el sprint terminó bien?) y pegue la captura del tablero de Jira al cerrar cada sprint.

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 - Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	DD/MM/AAAA
		Página:	12 de 20

Sprint 3	22/08–28/08/2026 · Torneos, inscripción y alineaciones
-----------------	---

Features del sprint	FEAT-04 · FEAT-05 · FEAT-06 (parcial)
Entregable clave	Organizador crea torneo. Capitán inscribe equipo con comprobante. Calendario visible.
Capacidad	20 puntos
Criterio de cierre	El organizador puede crear torneos y cambiar estados. Los capitanes pueden inscribir equipos con comprobante. El calendario muestra los partidos programados. La alineación básica se puede guardar.

TCH Sprint 3

22 ago – 28 ago (3 actividades)

46

0

0

Iniciar sprint

...

TCH-5

FEAT-04 - Inscripción al torne...

TCH-EPIC-01 - Pla...

Por hacer ▾

12

TCH-6

FEAT-05 - Gestión del torneo ...

TCH-EPIC-01 - Pla...

Por hacer ▾

18

TCH-7

FEAT-06 - Alineaciones y com...

TCH-EPIC-01 - Pla...

Por hacer ▾

16

+ Crear

Sprint 4	29/08–04/09/2026 · Competencia y arbitraje en vivo
-----------------	---

Features del sprint	FEAT-06 (cierre) · FEAT-07 · FEAT-08
Entregable clave	Capitán gestiona alineaciones. Árbitro opera el módulo en vivo. Logística registrada.
Capacidad	20 puntos
Criterio de cierre	Las alineaciones con arrastrar y soltar funcionan. El árbitro puede iniciar partido, registrar goles, tarjetas y sustituciones. La logística registra entregas.

TCH Sprint 4

29 ago – 4 sep (2 actividades)

28

0

0

Iniciar sprint

...

TCH-9

FEAT-07 - Módulo de arbitraje ...

TCH-EPIC-01 - Pla...

Por hacer ▾

18

TCH-8

FEAT-08 - Logística (refrigerio...

TCH-EPIC-01 - Pla...

Por hacer ▾

10

+ Crear

Sprint 5	05/09–11/09/2026 · Estadísticas, comunicaciones y llaves
-----------------	---

Features del sprint	FEAT-09 · FEAT-10 · FEAT-11
Entregable clave	Estadísticas automáticas. Chat de equipo. Llaves eliminatorias generadas.

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 - Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	DD/MM/AAAA
		Página:	13 de 20

Capacidad	20 puntos
Criterio de cierre	Las estadísticas individuales y de equipo se calculan automáticamente. El chat de equipo funciona. Las llaves eliminatorias se generan al finalizar fase de grupos.

☐ TCH Sprint 5 5 sep – 11 sep (3 actividades)

4900Iniciar sprint...

TCH-10 FEAT-09 - Estadísticas indivi...TCH-EPIC-01 - Pla...Por hacer16

TCH-11 FEAT-10 - Comunicaciones y...TCH-EPIC-01 - Pla...Por hacer15

TCH-12 FEAT-11 - Llaves eliminatoria...TCH-EPIC-01 - Pla...Por hacer18

+ Crear

Sprint 6	12/09–18/09/2026 · Dashboard y correcciones
-----------------	--

Features del sprint	FEAT-12 · Corrección de bugs S4-S5
Entregable clave	Dashboard del organizador. Bugs críticos corregidos. Pruebas de integración.
Capacidad	20 puntos
Criterio de cierre	El dashboard muestra partidos del día, alertas de inscripciones y logística. Los bugs reportados en sprints anteriores están corregidos. Las pruebas de integración pasan.

☐ TCH Sprint 6 12 sep – 18 sep (1 actividad)

1400Iniciar sprint...

TCH-13 FEAT-12 - Dashboard del org...TCH-EPIC-01 - Pla...Por hacer14

+ Crear

Sprint 7	19/09–01/10/2026 · Documentación final y demo
-----------------	--

Features del sprint	FEAT-INF-02 (cierre) · FEAT-INF-05
Entregable clave	README completo. Arquitectura documentada. Presentación lista. Demo en staging. Entrega el 01/10.
Capacidad	28 puntos
Criterio de cierre	La documentación técnica está completa (README, arquitectura, Swagger). La presentación final y la demo están preparadas. El sistema está desplegado en staging y funciona correctamente. Se entrega el 1 de octubre.

☐ TCH Sprint 7 19 sep – 1 oct (2 actividades)

900Iniciar sprint...

TCH-15 FEAT-INF-02 - Documentación técnica

TCH-EPI...Por hacer5

TCH-18 FEAT-INF-05 - Presentación final y demo

TCH-EPI...Por hacer4

+ Crear

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 - Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	DD/MM/AAAA
		Página:	15 de 20

7. Configuración en Jira — paso a paso

Una vez documentado todo en este taller, DOSW lo carga en Jira en el orden correcto. El orden importa: los niveles superiores deben existir antes de crear los inferiores.

Pas o	Qué crea DOSW en Jira	Dónde	Captura requerida
1	Proyecto tipo Scrum con el nombre correcto del equipo	Projects → Create Project → Scrum	C1 — pantalla del proyecto creado
2	Épica TCH-EPIC-01 con todos sus campos diligenciados	Backlog → Create Issue → Epic	C2 — épica abierta con descripción y fechas
3	Todos los features como hijos de la épica	Épica → Create child issue → Feature	C3 — árbol épica → features
4	Las tareas como Sub-tasks del feature (NO de una HU — ese nivel no existe en Jira)	Feature → Create subtask	C4 — feature abierto con descripción/HU en texto, criterios y subtareas con puntos
5	Los 7 sprints con sus fechas exactas configurados	Backlog → Create Sprint → editar fechas	C5 — lista de sprints con fechas correctas
6	Las tareas distribuidas en los sprints arrastrándolas desde el backlog	Backlog → drag & drop hacia el sprint	C6 — backlog con tareas en cada sprint y puntos visibles
7	Sprint 1 iniciado	Backlog → Start Sprint	C7 — tablero Kanban del Sprint 1 activo


Configuración de Story Points: Project Settings → Features → habilitar Story Points. En cada Sub-task asignar el campo Story Points (1, 2 o 3). Jira suma los puntos automáticamente en el Backlog. Si el total del sprint supera la capacidad (20 pts), DOSW mueve tareas al siguiente sprint.

8.1 Las 7 capturas requeridas


Incluyan las capturas en orden en este documento. Cada captura debe ser legible y mostrar el elemento descrito.

- **C1:** Proyecto Jira creado con el nombre del equipo.
- **C2:** Épica TCH-EPIC-01 abierta con descripción, criterios de éxito y fechas.
- **C3:** Vista de la épica mostrando todos los features como hijos.
- **C4:** Un feature abierto mostrando su descripción con las HU en texto, criterios de aceptación y sus subtareas con Story Points.
- **C5:** Backlog con los 7 sprints configurados y sus fechas.
- **C6:** Backlog completo con las tareas distribuidas en cada sprint (vista de puntos visible).
- **C7:** Tablero Kanban del Sprint 1 activo con las columnas To Do / In Progress / Done.

Captura C1

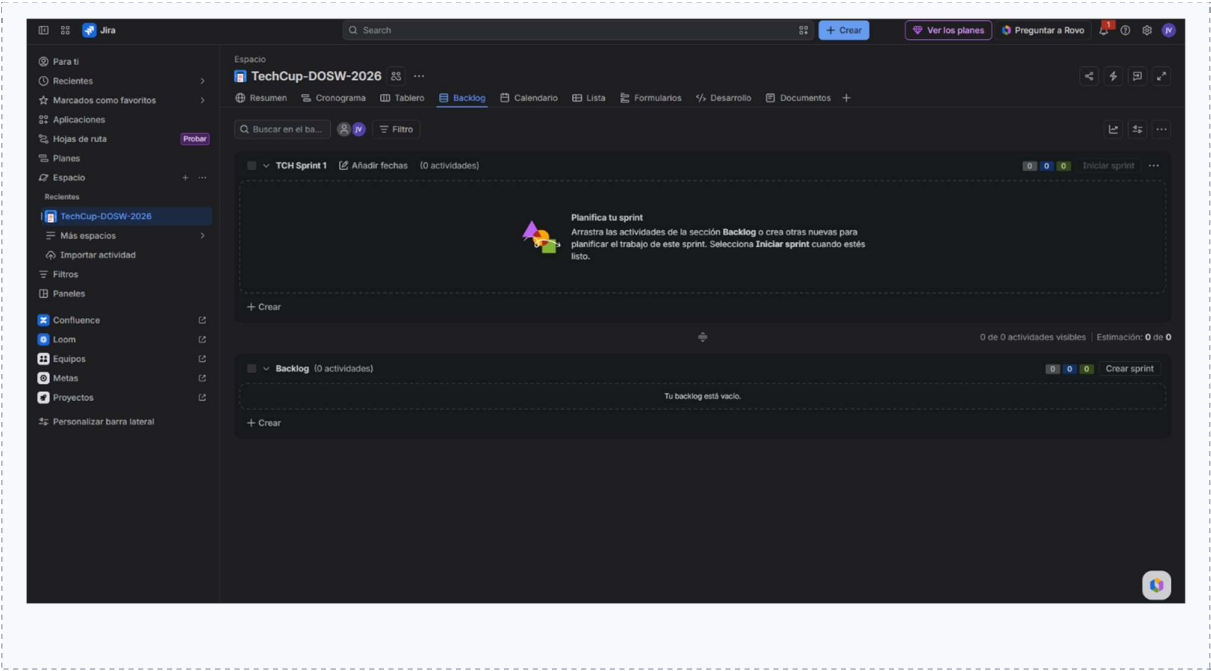

Captura C2

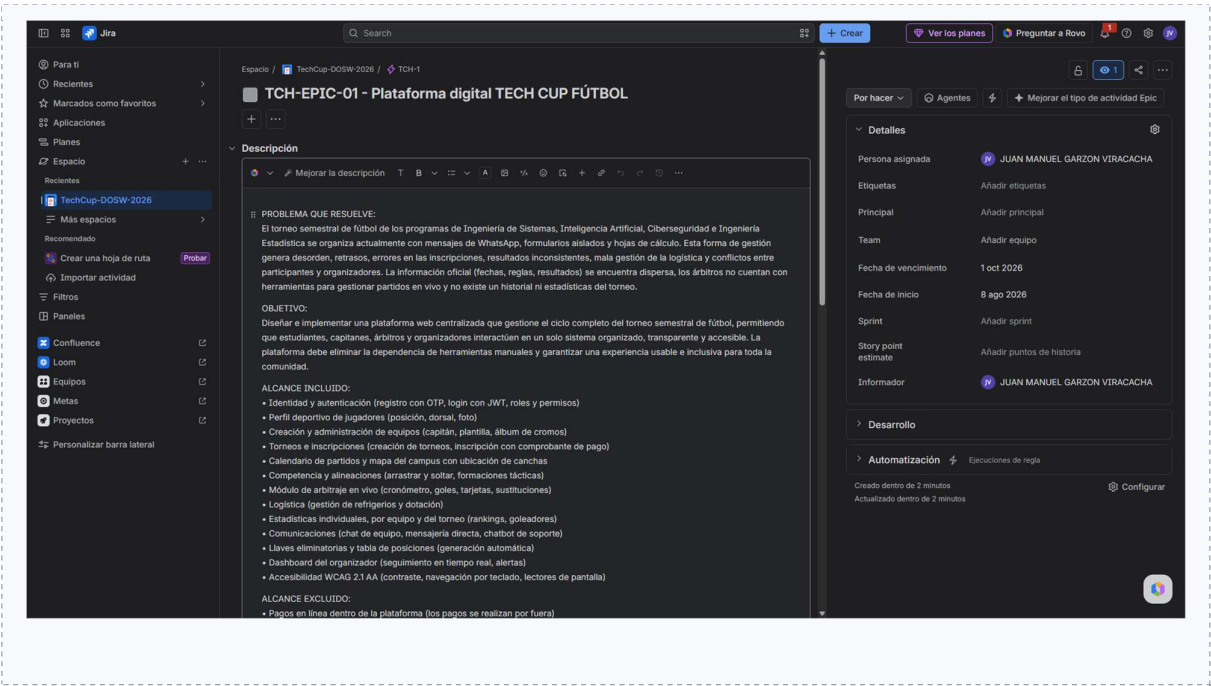

Captura C3

Actividades secundarias

Actividad	Prior...	Pers...	Estado
ICH-2 FEAT-01 - Registro e identidad de usuarios	M...	Sin	Por hacer
ICH-3 FEAT-02 - Perfil deportivo y gestión de jugadores	M...	Sin	Por hacer
ICH-4 FEAT-03 - Creación y administración de equipos	M...	Sin	Por hacer
ICH-5 FEAT-04 - Inscripción al torneo y verificación de pago	M...	Sin	Por hacer
ICH-6 FEAT-05 - Gestión del torneo y calendario de partidos	M...	Sin	Por hacer
ICH-7 FEAT-06 - Alineaciones y competencia	M...	Sin	Por hacer
ICH-8 FEAT-08 - Logística (refrigerios y dotación)	M...	Sin	Por hacer
ICH-9 FEAT-07 - Módulo de arbitraje en vivo	M...	Sin	Por hacer
ICH-10 FEAT-09 - Estadísticas individuales y por equipo	M...	Sin	Por hacer
ICH-11 FEAT-10 - Comunicaciones y chats	M...	Sin	Por hacer
ICH-12 FEAT-11 - Llaves eliminatorias y tabla de posiciones	M...	Sin	Por hacer
ICH-13 FEAT-12 - Dashboard del organizador	M...	Sin	Por hacer
ICH-14 FEAT-INF-01 - Configuración del repositorio y ramas	M...	Sin	Por hacer
ICH-15 FEAT-INF-02 - Documentación técnica	M...	Sin	Por hacer
ICH-16 FEAT-INF-03 - Manual de identidad visual	M...	Sin	Por hacer
ICH-17 FEAT-INF-04 Configuración de Jira	M...	Sin	Por hacer
ICH-18 FEAT-INF-05 - Presentación final y demo	M...	Sin	Por hacer

Actividades vinculadas
Añadir actividad vinculada

Detalles

Persona asignada: JUAN MANUEL GARZON VIRACACHA

Etiquetas: Añadir etiquetas

Principal: Añadir principal

Team: Añadir equipo

Fecha de vencimiento: 1 oct 2026

Fecha de inicio: 8 ago 2026

Sprint: Añadir sprint

Story point estimate: Añadir puntos de historia

Informador: JUAN MANUEL GARZON VIRACACHA

Desarrollo

Automatización Ejecuciones de regla

Creado hace 24 minutos Actualizado hace 24 minutos

Captura C4

Detalles

Persona asignada: Sin asignar

Principal: Asignarme a mí

Sprint: Añadir sprint

Etiquetas: Añadir etiquetas

Fecha de vencimiento: Añadir fecha de vencimiento

Team: Añadir equipo

Fecha de inicio: Añadir fecha

Story point estimate: Añadir puntos de historia

Informador: JUAN MANUEL GARZON VIRACACHA

Desarrollo

Automatización Ejecuciones de regla

Creado hace 23 minutos Actualizado hace 23 minutos

Archivos adjuntos

Añadir un archivo adjunto


Subtareas

Actividad	Prior...	Pers...	Estado
TASK-01 - Crear la entidad Usuario en PostgreSQL	M...	Sin	Por hacer
TASK-02 - Implementar endpoint POST /api/v1/auth/register	M...	Sin	Por hacer
TASK-03 - Implementar el servicio de envío de OTP	M...	Sin	Por hacer
TASK-04 - Implementar endpoint POST /api/v1/auth/verify-otp	M...	Sin	Por hacer
TASK-05 - Implementar endpoint POST /api/v1/auth/login	M...	Sin	Por hacer
TASK-06 - Configurar Spring Security y Mockito en JUnit	M...	Sin	Por hacer


Captura C5



Captura C6

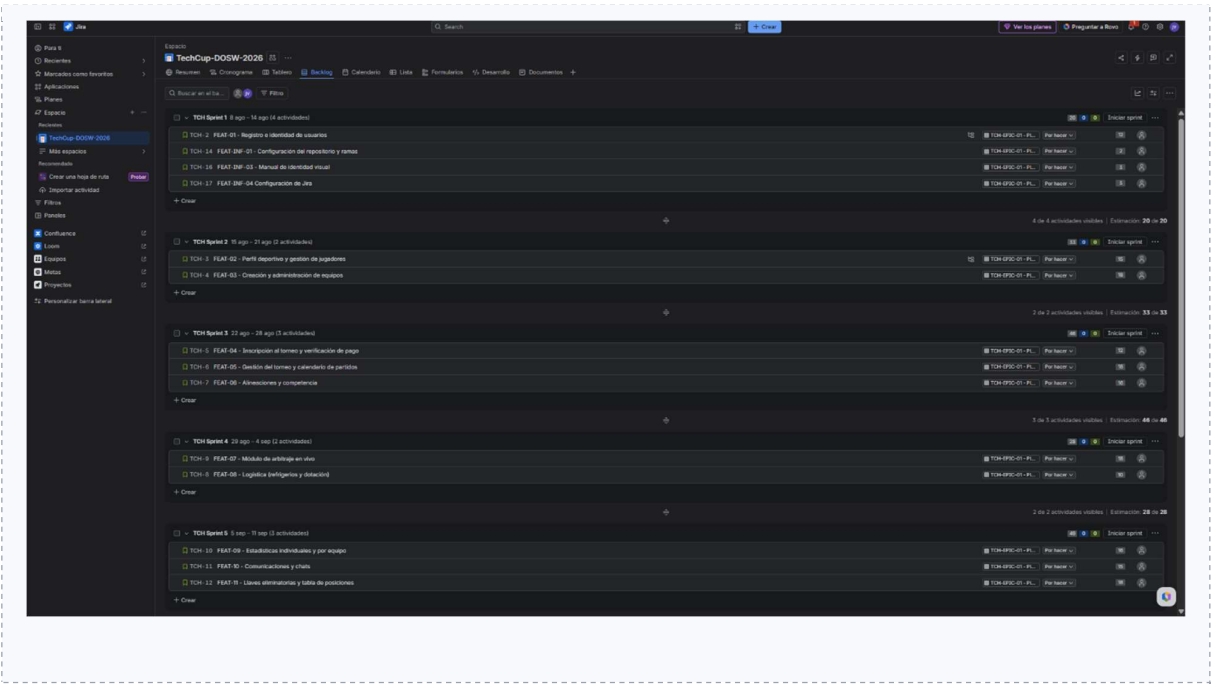

Captura C7

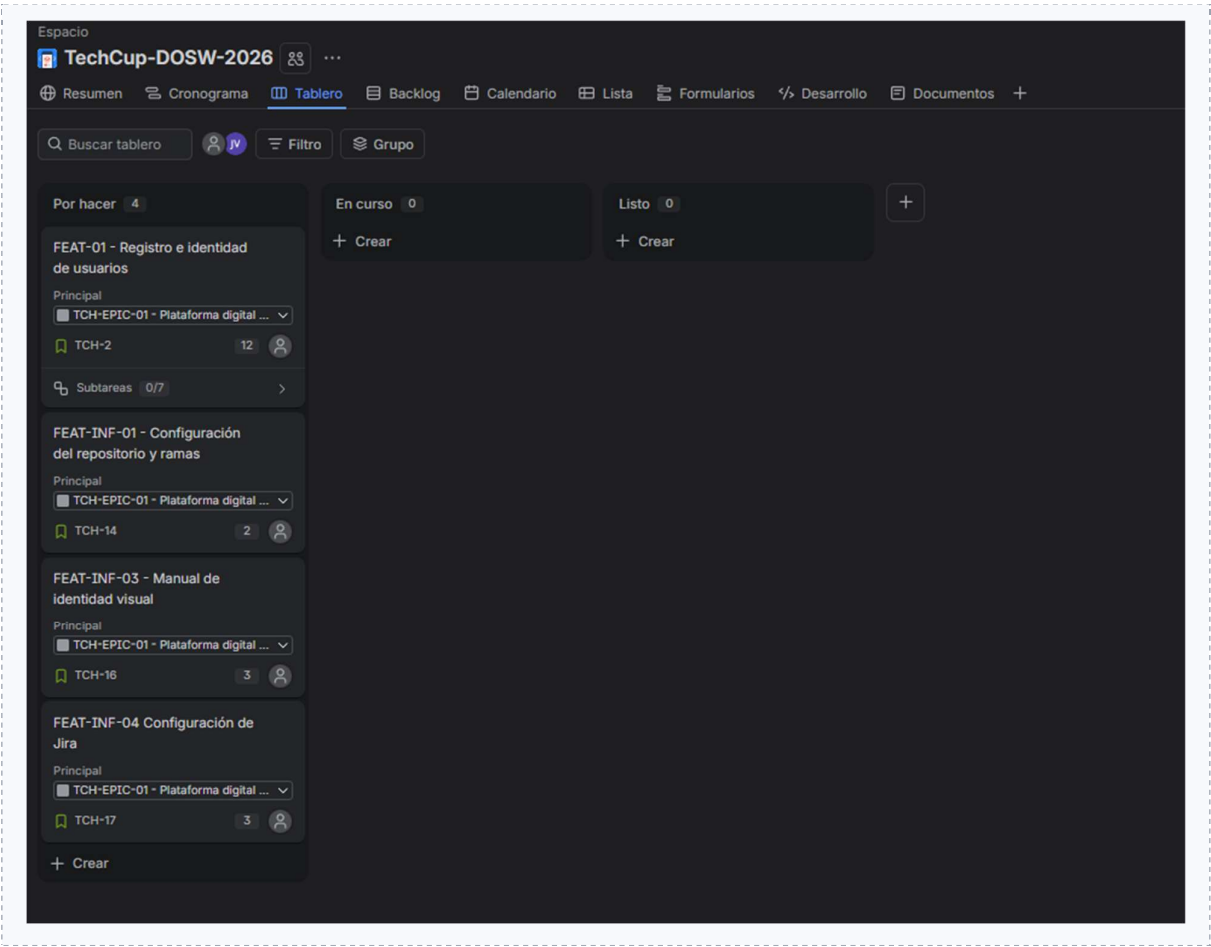

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 - Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	DD/MM/AAAA
		Página:	20 de 20

8. Criterios de evaluación

Actividad	Criterio	Pts
Diagrama C4	Todos los actores del enunciado, sistemas externos, flechas etiquetadas y límite del sistema claro.	10
Épica en Jira	TCH-EPIC-01 creada con todos los campos: descripción, criterios de éxito, alcance incluido/excluido y fechas correctas.	10
Features documentados	Todos los features tienen descripción con las HU en formato Como/quiero/para, mínimo 2 criterios en Dado/Cuando/Entonces (uno de error), features de infraestructura incluidos.	30
Tareas descritas	Todas las tareas tienen título con verbo en infinitivo, descripción que el desarrollador puede ejecutar sin preguntas, puntos (1-3) y definición de terminado.	20
Sprints en Jira	7 sprints con fechas correctas. Distribución razonable. Ningún sprint supera su capacidad. Criterio de cierre definido.	10
Capturas de Jira	Las 8 capturas están presentes, son legibles y muestran la estructura completa.	10
